

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0169-190808-05 Datum van het onderzoek : 08/08/19
Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:


ADRES INSTALLATIE : MBAMBU MASWAKU TIMOTHEE
DIJKSTRAAT 13
1820 STEENOKKERZEEL

EIGENAAR : MBAMBU MASWAKU TIMOTHEE
Adres : DIJKSTRAAT 13
1820 STEENOKKERZEEL

OPDRACHTGEVER : A PROPERTY-PELSMAEKERS
Adres : LEUVENSESTEENWEG 417
3070 KORTENBERG

INSTALLATEUR :
Adres :

Visualisatie van de installatie

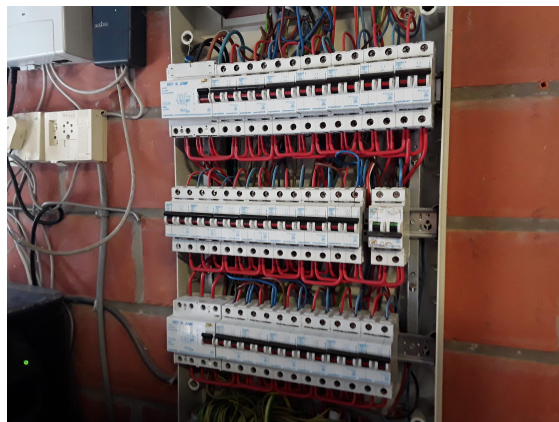

BTW of IK :

EAN : **Teller nr.** 66705724 **Index :** 64240,0

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Type der Lokalen :	wooneenheid
Begin werken fundering: Na 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning : 3x230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	40 A
Type van de aardelektrode: Lus	Alg. schakelaar: type :	4p 40A/300mA
Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen :	21
Uitwendige invloedsfactoren :	Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 271,

VMA - 48.5

MA-LS-02/2015

Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN:

RA: 9,07 Ohm RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING:

verdeelkast
1×diff 40A 300mA
1×diff 40A 30mA
3×kring 16A 2p autom
18×kring 20A 2p autom

VASTGESTELDE INBREUKEN

- 1 De dienstspanning is niet op elk bord vermeld (art. 5, 16 AREI).
- 2 Het ééndraadsschema ontbreekt (art. 16 AREI).
- 3 Het situatieschema ontbreekt (MB 27/7/1981).
- 4 De continuïteit van de beschermingsgeleider van het stopcontact is te herzien (art. 70 AREI).

NOTA'S

Geen

BESLUIT

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 08/08/2020.

De agent-onderzoeker,
0169 JORG COOLS

voor De Directeur,

**UITGEVOERDE CONTROLES**

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede

VMA - 48.5

Verslagnummer 0169-190808-05

onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS DE INSTALLATIE NIET-CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de inbreuken die vastgesteld zijn. Tref de nodige dringende maatregelen.

STAP 2

Indien nodig laat u bijstaan door een installateur en bespreek met hem de inbreuken. Doe de nodige aanpassingen.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 08/08/2020.

STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.
